



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

PROGRAMMA OPERATIVO FERS CALABRIA 2007-2013

Programma Operativo Nazionale FESR

"Ambienti per l'apprendimento"

Asse II "Qualità degli ambienti scolastici"

Obiettivo "C"

Istituto Comprensivo

Tiriolo

Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo grado



COMUNE di CICALA

(Prov. di Catanzaro)

PROGETTO ESECUTIVO

MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ATTANZIO

ALLEGATO:	TITOLO:	SCALA DI RAPPR.
8	<i>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</i>	

PROGETTISTA
(Respons. Ufficio Tecnico Comune di CICALA)
Geom. Luigi BONACCI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Il Dirigente Scolastico)
Dott.ssa Rita PAONE

IL SINDACO
Geom. Alessandro FALVO

PROGETTO ESECUTIVO



Comune di CICALA
Provincia di Catanzaro

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ATTANZIO

COMMITTENTE:

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 235.316,13
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	€ 33.686,07
Oneri della sicurezza	€ 6.063,55
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 102.521,71
Costo complessivo dell'opera	€ 349.686,07

CICALA, lì DICEMBRE 2013

Il Progettista:

ID	Nome	Durata 107,00 g - 107,00	Inizio	Fine	07 apr 14					14 apr 14					21 apr 14					28 apr 14					05 mag 14					12 mag 14						
					m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s
1	LC - LAVORI A CORPO	107,00	gio 10/04/14	ven 05/09/14																																
2	1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	70,00	lun 21/04/14	ven 25/07/14																																
3	PR.R.0250.10/a) Spicc - Spicconatura	10,00	lun 21/04/14	ven 02/05/14																																
4	PR.R.02110.50/a) Di su - Smontaggio	15,00	lun 07/07/14	ven 25/07/14																																
5	2 - SOGLIE IN MARMO	5,00	lun 30/06/14	ven 04/07/14																																
6	PR.E.1410.21/a) Pietr - Soglie lisce,	5,00	lun 30/06/14	ven 04/07/14																																
7	3 - INTONACI	10,00	lun 05/05/14	ven 16/05/14																																
8	PR.E.1620.60/d) con m - Intonaco civile	10,00	lun 05/05/14	ven 16/05/14																																
9	4 - INFISSI	25,00	lun 07/07/14	ven 08/08/14																																
10	PR.E.18140.70/b) Per a - Telaio in	25,00	lun 07/07/14	ven 08/08/14																																
11	INF.PVC.01 - Serramenti, per finestre o	25,00	lun 07/07/14	ven 08/08/14																																
12	PR.E.1850.20/a) Porta - Porta per	25,00	lun 07/07/14	ven 08/08/14																																
13	5 - OPERE DA PITTORE ISOLANTI E	35,00	lun 19/05/14	ven 04/07/14																																
14	PR.E.2110.20/a) Fondo - Fondo	35,00	lun 19/05/14	ven 04/07/14																																
15	PR.E.1060.10/a) spess - Sistema di	35,00	lun 19/05/14	ven 04/07/14																																
16	PR.E.1060.10/b) sovra - Sistema di	35,00	lun 19/05/14	ven 04/07/14																																
17	PR.E.2130.50/a) granu - Rivestimento	35,00	lun 19/05/14	ven 04/07/14																																
18	PR.E.1550.10/c) Con l - Rivestimento	35,00	lun 19/05/14	ven 04/07/14																																
19	6 - OPERE PROVVISORIALI	107,00	gio 10/04/14	ven 05/09/14																																
20	PR.P.0310.30/a) Per i - PONTEGGIO	17,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
21	PR.P.0310.30/b) Per o - PONTEGGIO	17,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
22	PR.P.0310.90/a) Nolo - PIANI DI	17,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
23	PR.P.0310.90/b) Nolo - PIANI DI	17,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
24	PR.P.0310.110/a) Nolo - MODULO	17,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
25	PR.P.0310.110/b) Nolo - MODULO	17,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
26	PR.P.0310.50/a) Scher -	17,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
27	OS - ONERI PER LA SICUREZZA	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
28	Altro - Altro	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
29	PR.S.0150.10.a - Recinzione	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
30	PR.S.0150.30.a - Recinzione su strada	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
31	PR.S.0140.10.a - Prefabbricato	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
32	PR.S.0140.80.a - Bagno chimico	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
33	Sic_3 - Segnaletica stradale di	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
34	Sic_1 - Collegamento dei conduttori di	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
35	Sic_10 - Dispersore in acciaio ramato	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
36	Sic_11 - Corda di rame nuda	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
37	Sic_9 - Cartelli di obbligo, conformi al	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
38	Sic_2 - Controllo periodico di verifica	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
39	Sic_5 - Impianto di preavviso di	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
40	Sic_8 - Integratore luminoso per	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
41	Sic_6 - Integratore luminoso per	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																
42	Sic_4 - CARTELLI DI OBBLIGO sfondo	7,00	gio 10/04/14	ven 18/04/14																																

[illegible]

[illegible]

PROGETTO ESECUTIVO



Comune di CICALA
Provincia di Catanzaro

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ATTANZIO

COMMITTENTE:

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 235.316,13
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	€ 33.686,07
Oneri della sicurezza	€ 6.063,55
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 102.521,71
Costo complessivo dell'opera	€ 349.686,07

CICALA, lì DICEMBRE 2013

Il Progettista:

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 10/04/2014 a 30/05/2014	da 31/05/2014 a 21/06/2014	da 22/06/2014 a 09/07/2014	da 10/07/2014 a 19/07/2014	da 20/07/2014 a 30/07/2014	da 31/07/2014 a 03/09/2014
LC - LAVORI A CORPO	€ 235.316,13	€ 34.346,91	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65
1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	(€ 3.131,50)	(€ 1.170,00)		(€ 309,71)	(€ 1.032,37)	(€ 619,42)	
PR.R.0250.10/a) Spicc - Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ole zone e spazzolatura delle superfici							
a) Spicconatura di intonaco a vivo di ...ole zone e spazzolatura delle superfici	(€ 1.170,00)	(€ 1.170,00)					
PR.R.02110.50/a) Di su - Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m							
a) Di superficie fino a 3 m°	(€ 1.961,50)			(€ 309,71)	(€ 1.032,37)	(€ 619,42)	
2 - SOGLIE IN MARMO	(€ 7.234,94)			(€ 7.234,94)			
PR.E.1410.21/a) Pietr - Soglie lisce, pedate e sottogradi di g...atura. sigillatura dei giunti e grappe.							
a) Pietra reggina, con frontalino incollato 2+2 per frontalino esterno cm. 4	(€ 7.234,94)			(€ 7.234,94)			
3 - INTONACI	(€ 5.337,50)	(€ 5.337,50)					
PR.E.1620.60/d) con m - Intonaco civile formato da un primo st...5 mm. Per esterni su pareti verticali:							
d) con malta bastarda con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	(€ 5.337,50)	(€ 5.337,50)					
4 - INFISSI	(€ 119.829,61)			(€ 10.893,59)	(€ 36.312,00)	(€ 39.943,20)	(€ 32.680,82)
PR.E.18140.70/b) Per a - Telaio in alluminio per la realizzazio...esterni, in opera compreso, ferramenta							
b) Per anta di finestra Per anta di finestra	(€ 24.316,75)			(€ 2.210,61)	(€ 7.368,71)	(€ 8.105,58)	(€ 6.631,85)
INF.PVC.01 - Serramenti, per finestre o porte, in p...la per l'attenuazione dei raggi solari.							
A Riportare:		€ 34.346,91	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 10/04/2014 a 30/05/2014	da 31/05/2014 a 21/06/2014	da 22/06/2014 a 09/07/2014	da 10/07/2014 a 19/07/2014	da 20/07/2014 a 30/07/2014	da 31/07/2014 a 03/09/2014
Riporto:		€ 34.346,91	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65
	(€ 94.958,20)			(€ 8.632,56)	(€ 28.775,21)	(€ 31.652,73)	(€ 25.897,70)
PR.E.1850.20/a) Porta - Porta per esterni in acciaio con apert...io, 2 cerniere e maniglione antipanico a) Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	(€ 554,66)			(€ 50,42)	(€ 168,08)	(€ 184,89)	(€ 151,27)
5 - OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI	(€ 86.143,43)	(€ 21.994,07)	(€ 40.322,46)	(€ 23.826,90)			
PR.E.2110.20/a) Fondo - Fondo fissante, ancorante ed isolante ...li ed organiche), applicato a pennello a) Fondo fissante, ancorante ed isolan...ali ed organiche), applicato a pennello	(€ 2.607,82)	(€ 665,83)	(€ 1.220,68)	(€ 721,31)			
PR.E.1060.10/a) spess - Sistema di isolamento a cappotto reali...er la riquadratura di porte e finestre. a) spessore 40 mm spessore 40 mm	(€ 41.312,15)	(€ 10.547,78)	(€ 19.337,60)	(€ 11.426,77)			
PR.E.1060.10/b) sovra - Sistema di isolamento a cappotto reali...er la riquadratura di porte e finestre. b) sovrapprezzo per ogni cm in più di ...apprezzo per ogni cm in più di spessore	(€ 17.472,37)	(€ 4.461,03)	(€ 8.178,56)	(€ 4.832,78)			
PR.E.2130.50/a) granu - Rivestimento plastico a base di resine...rte. Superficie graffiata, per interni a) granulometria media, per spessore 2 mm granulometria media, per spessore 2 mm	(€ 18.886,24)	(€ 4.822,02)	(€ 8.840,37)	(€ 5.223,85)			
PR.E.1550.10/c) Con l - Rivestimento formato da frammenti di l...opera eseguita A Riportare:		€ 34.346,91	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 10/04/2014 a 30/05/2014	da 31/05/2014 a 21/06/2014	da 22/06/2014 a 09/07/2014	da 10/07/2014 a 19/07/2014	da 20/07/2014 a 30/07/2014	da 31/07/2014 a 03/09/2014
Riporto:		€ 34.346,91	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65
a perfetta regola d'arte							
c) Con lastre di Luserna granito, comp...mento da eseguirsi con materiali idonei	(€ 5.864,85)	(€ 1.497,41)	(€ 2.745,25)	(€ 1.622,19)			
6 - OPERE PROVVISORIALI	(€ 13.639,15)	(€ 5.845,34)					(€ 6.494,83)
PR.P.0310.30/a) Per i - PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Ponteg...r metro quadro di superficie asservita							
a) Per il 1° mese o frazione	(€ 3.255,92)	(€ 1.395,39)					(€ 1.550,44)
PR.P.0310.30/b) Per o - PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Ponteg...r metro quadro di superficie asservita							
b) Per ogni mese o frazione dopo il 1°	(€ 286,35)	(€ 122,72)					(€ 136,36)
PR.P.0310.90/a) Nolo - PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGI...er metro quadro di superficie effettiva							
a) Nolo per il 1° mese o frazione	(€ 6.342,15)	(€ 2.718,06)					(€ 3.020,07)
PR.P.0310.90/b) Nolo - PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGI...er metro quadro di superficie effettiva							
b) Nolo per ogni mese dopo il 1°	(€ 413,62)	(€ 177,27)					(€ 196,96)
PR.P.0310.110/a) Nolo - MODULO SCALA PER PONTEGGIO Modulo sca...Misurato per metro di altezza effettiva							
a) Nolo per il 1° mese o frazione	(€ 348,83)	(€ 149,50)					(€ 166,11)
PR.P.0310.110/b) Nolo - MODULO SCALA PER PONTEGGIO Modulo sca...Misurato per metro di altezza effettiva							
b) Nolo per ogni mese dopo il 1°	(€ 22,71)	(€ 9,73)					(€ 10,81)
A Riportare:		€ 34.346,91	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 10/04/2014 a 30/05/2014	da 31/05/2014 a 21/06/2014	da 22/06/2014 a 09/07/2014	da 10/07/2014 a 19/07/2014	da 20/07/2014 a 30/07/2014	da 31/07/2014 a 03/09/2014
Riporto:		€ 34.346,91	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65
PR.P.0310.50/a) Scher - SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA D...utata per metro quadro di telo in opera a) Schermatura antipolvere o antisabbia	(€ 2.969,57)	(€ 1.272,67)					(€ 1.414,08)
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 6.063,55	€ 6.063,55					
	(€ 6.063,55)	(€ 6.063,55)					
PR.S.0150.10.a - Recinzione provvisoria modulare da can...vo smontaggio e rimozione a fine lavori	(€ 349,00)	(€ 349,00)					
PR.S.0150.30.a - Recinzione su strada mediante lamiere ... montaggio e smontaggio della struttura	(€ 577,60)	(€ 577,60)					
PR.S.0140.10.a - Prefabbricato modulare componibile. di...mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm	(€ 430,40)	(€ 430,40)					
PR.S.0140.80.a - Bagno chimico portatile, realizzato in...asporto e smaltimento rifiuti speciali	(€ 673,85)	(€ 673,85)					
Sic_3 - Segnaletica stradale di prescrizione (...icarsi_sui_ponteggi [SG-5] Alto_rischio	(€ 481,60)	(€ 481,60)					
Sic_1 - Collegamento dei conduttori di terra a...e da 10x25 mm. [IT-1] Impianti di Terra	(€ 30,20)	(€ 30,20)					
Sic_10 - Dispersore in acciaio ramato del tipo ...iametro 18 mm [IT-1] Impianti di Terra	(€ 474,40)	(€ 474,40)					
Sic_11 - Corda di rame nuda elettrolitica inter...zione 10 mm2. [IT-1] Impianti di Terra	(€ 1.376,40)	(€ 1.376,40)					
A Riportare:		€ 40.410,46	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 10/04/2014 a 30/05/2014	da 31/05/2014 a 21/06/2014	da 22/06/2014 a 09/07/2014	da 10/07/2014 a 19/07/2014	da 20/07/2014 a 30/07/2014	da 31/07/2014 a 03/09/2014
Riporto:		€ 40.410,46	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65
Sic_9 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs ...do bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	(€ 51,35)	(€ 51,35)					
Sic_2 - Controllo periodico di verifica dell'e... per impianto. [IT-1] Impianti di Terra	(€ 397,80)	(€ 397,80)					
Sic_5 - Impianto di preavviso di semaforo in p...Posizionamento e nolo per il primo mese	(€ 75,00)	(€ 75,00)					
Sic_8 - Integratore luminoso per segnalazioni ...osizionamento e nolo per il primo mese	(€ 445,20)	(€ 445,20)					
Sic_6 - Integratore luminoso per segnalazioni ...nto, nolo per mese successivo al primo	(€ 642,00)	(€ 642,00)					
Sic_4 - CARTELLI DI OBBLIGO sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m.	(€ 58,75)	(€ 58,75)					
IMPORTO		€ 40.410,46	€ 40.322,46	€ 42.265,14	€ 37.344,37	€ 40.562,62	€ 39.175,65
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 40.410,46	€ 80.732,92	€ 122.998,06	€ 160.342,43	€ 200.905,05	€ 240.080,70
%		16,74	16,70	17,51	15,47	16,80	16,23
% PROGRESSIVA		16,74	33,45	50,96	66,43	83,23	99,46

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 04/09/2014 a 05/09/2014					
LC - LAVORI A CORPO	€ 235.316,13	€ 1.298,98					
1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	(€ 3.131,50)						
PR.R.0250.10/a) Spicc - Spicconatura di intonaco a vivo di mur...ole zone e spazzolatura delle superfici							
a) Spicconatura di intonaco a vivo di ...ole zone e spazzolatura delle superfici	(€ 1.170,00)						
PR.R.02110.50/a) Di su - Smontaggio di infissi in ferro o allum...i risulta fino ad una distanza di 50 m							
a) Di superficie fino a 3 m°	(€ 1.961,50)						
2 - SOGLIE IN MARMO	(€ 7.234,94)						
PR.E.1410.21/a) Pietr - Soglie lisce, pedate e sottogradi di g...atura. sigillatura dei giunti e grappe.							
a) Pietra reggina, con frontalino incollato 2+2 per frontalino esterno cm. 4	(€ 7.234,94)						
3 - INTONACI	(€ 5.337,50)						
PR.E.1620.60/d) con m - Intonaco civile formato da un primo st...5 mm. Per esterni su pareti verticali:							
d) con malta bastarda con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento	(€ 5.337,50)						
4 - INFISSI	(€ 119.829,61)						
PR.E.18140.70/b) Per a - Telaio in alluminio per la realizzazio...esterni, in opera compreso, ferramenta							
b) Per anta di finestra Per anta di finestra	(€ 24.316,75)						
INF.PVC.01 - Serramenti, per finestre o porte, in p...la per l'attenuazione dei raggi solari.							
A Riportare:		€ 1.298,98					

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 04/09/2014 a 05/09/2014					
Riporto:		€ 1.298,98					
	(€ 94.958,20)						
PR.E.1850.20/a) Porta - Porta per esterni in acciaio con apert...io, 2 cerniere e maniglione antipanico							
a) Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	(€ 554,66)						
5 - OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI	(€ 86.143,43)						
PR.E.2110.20/a) Fondo - Fondo fissante, ancorante ed isolante ...li ed organiche), applicato a pennello							
a) Fondo fissante, ancorante ed isolan...ali ed organiche), applicato a pennello	(€ 2.607,82)						
PR.E.1060.10/a) spess - Sistema di isolamento a cappotto reali...er la riquadratura di porte e finestre.							
a) spessore 40 mm spessore 40 mm	(€ 41.312,15)						
PR.E.1060.10/b) sovra - Sistema di isolamento a cappotto reali...er la riquadratura di porte e finestre.							
b) sovrapprezzo per ogni cm in più di ...apprezzo per ogni cm in più di spessore	(€ 17.472,37)						
PR.E.2130.50/a) granu - Rivestimento plastico a base di resine...rte. Superficie graffiata, per interni							
a) granulometria media, per spessore 2 mm granulometria media, per spessore 2 mm	(€ 18.886,24)						
PR.E.1550.10/c) Con l - Rivestimento formato da frammenti di l...opera eseguita							
A Riportare:		€ 1.298,98					

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 04/09/2014 a 05/09/2014					
Riporto:		€ 1.298,98					
a perfetta regola d'arte							
c) Con lastre di Luserna granito, comp...mento da eseguirsi con materiali idonei	(€ 5.864,85)						
6 - OPERE PROVVISORIALI	(€ 13.639,15)	(€ 1.298,98)					
PR.P.0310.30/a) Per i - PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Ponteg...r metro quadro di superficie asservita							
a) Per il 1° mese o frazione	(€ 3.255,92)	(€ 310,09)					
PR.P.0310.30/b) Per o - PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Ponteg...r metro quadro di superficie asservita							
b) Per ogni mese o frazione dopo il 1°	(€ 286,35)	(€ 27,27)					
PR.P.0310.90/a) Nolo - PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGI...er metro quadro di superficie effettiva							
a) Nolo per il 1° mese o frazione	(€ 6.342,15)	(€ 604,02)					
PR.P.0310.90/b) Nolo - PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGI...er metro quadro di superficie effettiva							
b) Nolo per ogni mese dopo il 1°	(€ 413,62)	(€ 39,39)					
PR.P.0310.110/a) Nolo - MODULO SCALA PER PONTEGGIO Modulo sca...Misurato per metro di altezza effettiva							
a) Nolo per il 1° mese o frazione	(€ 348,83)	(€ 33,22)					
PR.P.0310.110/b) Nolo - MODULO SCALA PER PONTEGGIO Modulo sca...Misurato per metro di altezza effettiva							
b) Nolo per ogni mese dopo il 1°	(€ 22,71)	(€ 2,17)					
A Riportare:		€ 1.298,98					

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 04/09/2014 a 05/09/2014					
Riporto:		€ 1.298,98					
PR.P.0310.50/a) Scher - SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA D...utata per metro quadro di telo in opera a) Schermatura antipolvere o antisabbia	(€ 2.969,57)	(€ 282,82)					
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 6.063,55						
	(€ 6.063,55)						
PR.S.0150.10.a - Recinzione provvisoria modulare da can...vo smontaggio e rimozione a fine lavori	(€ 349,00)						
PR.S.0150.30.a - Recinzione su strada mediante lamiera ... montaggio e smontaggio della struttura	(€ 577,60)						
PR.S.0140.10.a - Prefabbricato modulare componibile. di...mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm	(€ 430,40)						
PR.S.0140.80.a - Bagno chimico portatile, realizzato in...asporto e smaltimento rifiuti speciali	(€ 673,85)						
Sic_3 - Segnaletica stradale di prescrizione (...icarsi_sui_ponteggi [SG-5] Alto_rischio	(€ 481,60)						
Sic_1 - Collegamento dei conduttori di terra a...e da 10x25 mm. [IT-1] Impianti di Terra	(€ 30,20)						
Sic_10 - Dispersore in acciaio ramato del tipo ...iametro 18 mm [IT-1] Impianti di Terra	(€ 474,40)						
Sic_11 - Corda di rame nuda elettrolitica inter...zione 10 mm2. [IT-1] Impianti di Terra	(€ 1.376,40)						
A Riportare:		€ 1.298,98					

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 04/09/2014 a 05/09/2014					
Riporto:		€ 1.298,98					
Sic_9 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs ...do bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	(€ 51,35)						
Sic_2 - Controllo periodico di verifica dell'e... per impianto. [IT-1] Impianti di Terra	(€ 397,80)						
Sic_5 - Impianto di preavviso di semaforo in p...Posizionamento e nolo per il primo mese	(€ 75,00)						
Sic_8 - Integratore luminoso per segnalazioni ...osizionamento e nolo per il primo mese	(€ 445,20)						
Sic_6 - Integratore luminoso per segnalazioni ...nto, nolo per mese successivo al primo	(€ 642,00)						
Sic_4 - CARTELLI DI OBBLIGO sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m.	(€ 58,75)						
IMPORTO		€ 1.298,98					
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 241.379,68					
%		0,54					
% PROGRESSIVA		100,00					

PROGETTO ESECUTIVO



Comune di CICALA
Provincia di Catanzaro

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ATTANZIO

COMMITTENTE:

PROGRAMMAZIONE S.A.L.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 235.316,13
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	€ 33.686,07
Oneri della sicurezza	€ 6.063,55
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 102.521,71
Costo complessivo dell'opera	€ 349.686,07

CICALA, lì DICEMBRE 2013

Il Progettista:

PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
10/04/2014	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Inizio lavori
30/05/2014	51	51	€ 40.410,46	€ 40.410,46	16,74	Si
21/06/2014	73	22	€ 80.732,92	€ 40.322,46	33,45	Si
09/07/2014	91	18	€ 122.998,07	€ 42.265,15	50,96	Si
19/07/2014	101	10	€ 160.342,44	€ 37.344,37	66,43	Si
30/07/2014	112	11	€ 200.905,06	€ 40.562,62	83,23	Si
03/09/2014	147	35	€ 240.080,71	€ 39.175,65	99,46	Si
05/09/2014	149	2	€ 241.379,68	€ 1.298,97	100,00	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 149 (centoquarantanove) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PROGETTO ESECUTIVO



Comune di CICALA
Provincia di Catanzaro

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ATTANZIO


COMMITTENTE:

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 235.316,13
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	€ 33.686,07
Oneri della sicurezza	€ 6.063,55
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 102.521,71
Costo complessivo dell'opera	€ 349.686,07

CICALA, lì DICEMBRE 2013

Il Progettista:

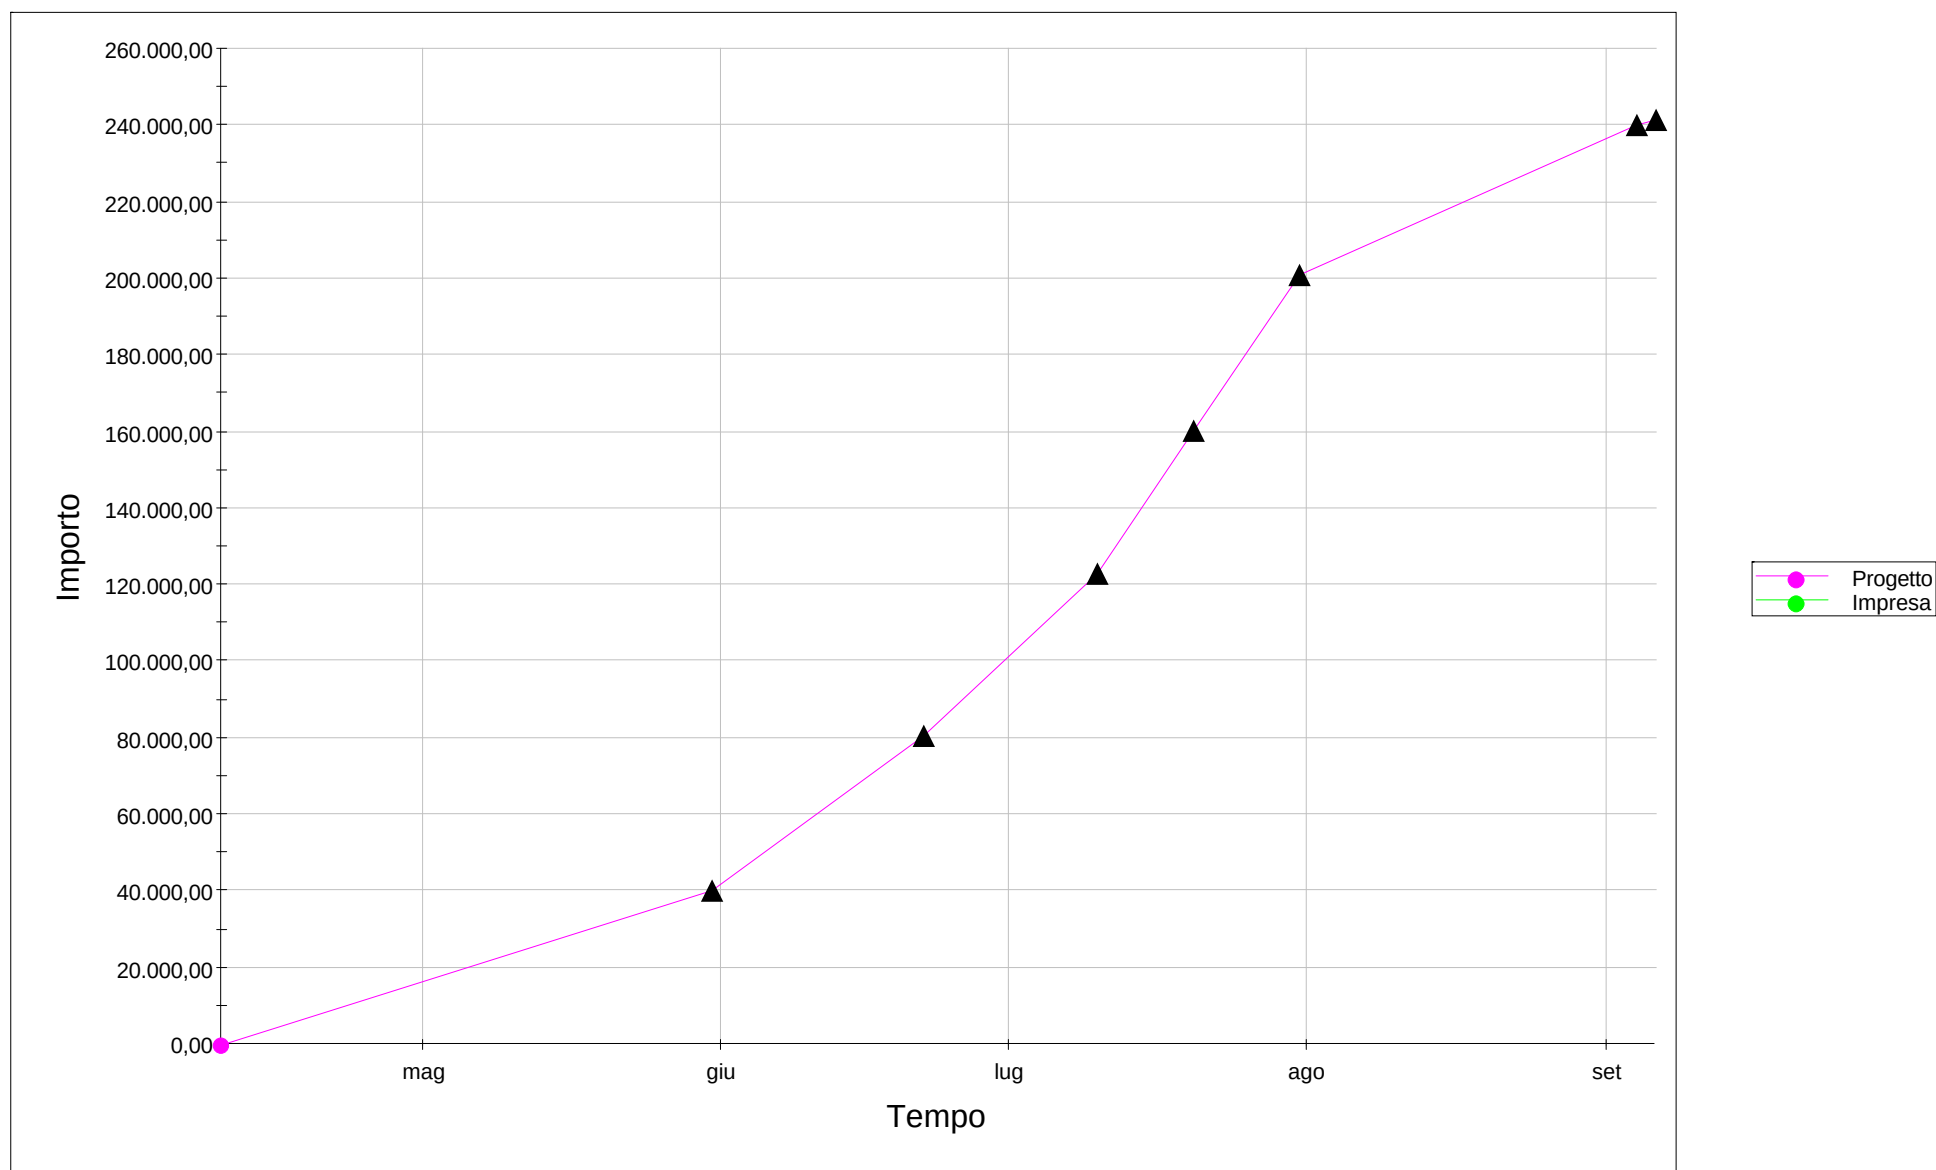

LEGENDA: ● punto che delimita periodi a media di produzione costante
▲ Stato Avanzamento Lavori programmato
